



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Regione Puglia

## COMUNE DI SURBO

Provincia di LECCE

LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA  
PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI  
NELL'ABITATO DI GIORGILORIO

II° LOTTO FUNZIONALE (AREA SUD)

P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D

CUP: I29B18000080001 - CIG: 99183880B5

## PROGETTO ESECUTIVO

00	Novembre 2023	PRIMA EMISSIONE
REV.	DATA	ATTIVITA'

Progettista :

Ing. MARCO BARBARA  
via Lupiae 12 - Lecce (LE)



committente:

COMUNE DI SURBO  
Via G. Codacci Pisanelli, 23  
73010 Surbo (LE)

R.U.P. Arch. VINCENZO PALADINI

titolo elaborato:

CRONOPROGRAMMA

codice elaborato:

R

**COMUNE DI SURBO**

**PROVINCIA DI SURBO**

# **Cronoprogramma di PROGETTO**


**OGGETTO:** LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA  
PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI  
NELL'ABITATO DI GIORGILORIO II° LOTTO FUNZIONALE (AREA  
SUD)  
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE  
6.4.D CUP: I29B18000080001 - CIG: 99183880B5

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SURBO

Il Tecnico  
(ING. MARCO BARBARA)

---

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				
				s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	6 g	5'000,00																																									
2	SICUREZZA	182 g	29'930,00																																									
3	OPERA TERMINALE - MOVIMENTI DI MATERIE	54 g	189'965,95																																									
4	OPERA TERMINALE - CONDOTTE E CADITOIE	3 g	9'893,66																																									
5	OPERA TERMINALE - OPERE D'ARTE	32 g	89'270,79																																									
6	OPERA TERMINALE - OPERE A VERDE	24 g	65'695,90																																									
7	CONDOTTE - MOVIMENTO DI MATERIE	46 g	165'197,82																																									
8	CONDOTTE - CONDOTTE E CADITOIE	39 g	284'783,79																																									
9	OPERA TERMINALE - RIPRISTINI STRADALI	2 g	677,87																																									
10	CONDOTTE - RIPRISTINI STRADALI	6 g	33'761,82																																									
11	SMOBILIZZO CANTIERE	4 g	5'000,00																																									

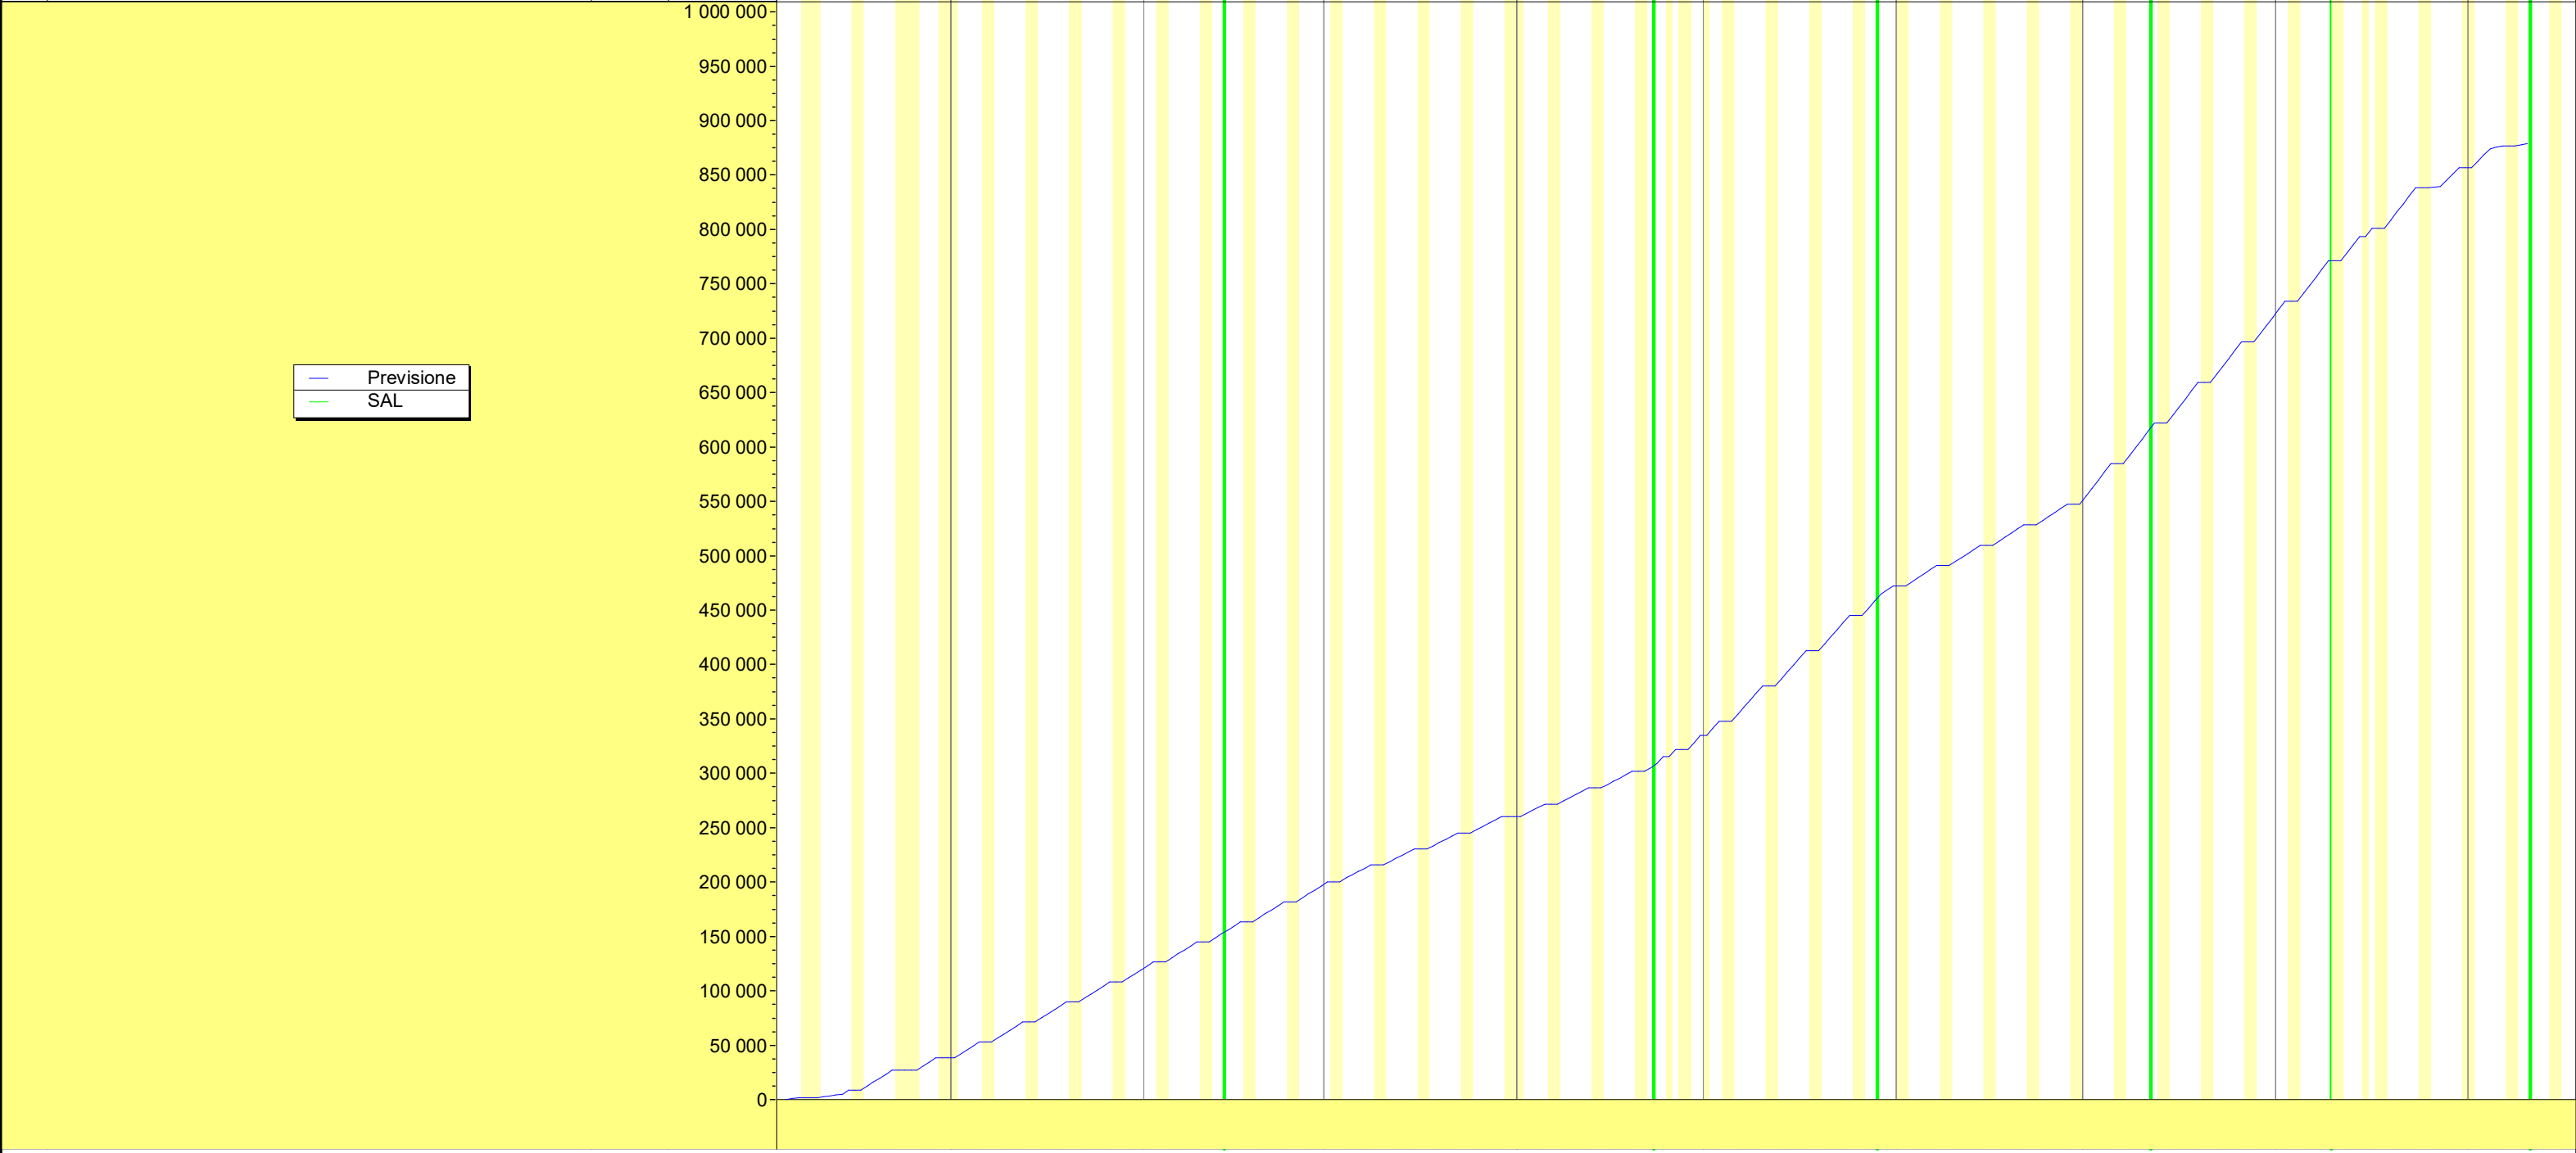

**COMUNE DI SURBO**

**PROVINCIA DI SURBO**

## **Tabella Attività**

**OGGETTO:** LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA  
PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI  
NELL'ABITATO DI GIORGILORIO II° LOTTO FUNZIONALE (AREA  
SUD)  
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE  
6.4.D CUP: I29B18000080001 - CIG: 99183880B5

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SURBO

Il Tecnico  
(ING. MARCO BARBARA)

---

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	GIORNI	
	euro	(%)			Fine Lav.	Tot.
ALLESTIMENTO CANTIERE	5'000,00	0,569	1 gg	9 gg	6	9
SICUREZZA	29'930,00	3,404	10 gg	274 gg	182	265
OPERA TERMINALE - MOVIMENTI DI MATERIE	189'965,95	21,607	10 gg	90 gg	54	81
OPERA TERMINALE - CONDOTTE E CADITOIE	9'893,66	1,125	136 gg	140 gg	3	5
OPERA TERMINALE - OPERE D'ARTE	89'270,79	10,154	91 gg	135 gg	32	45
OPERA TERMINALE - OPERE A VERDE	65'695,90	7,472	141 gg	176 gg	24	36
CONDOTTE - MOVIMENTO DI MATERIE	165'197,82	18,790	141 gg	206 gg	46	66
CONDOTTE - CONDOTTE E CADITOIE	284'783,79	32,392	209 gg	262 gg	39	54
OPERA TERMINALE - RIPRISTINI STRADALI	677,87	0,077	265 gg	266 gg	2	2
CONDOTTE - RIPRISTINI STRADALI	33'761,82	3,840	267 gg	274 gg	6	8
SMOBILIZZO CANTIERE	5'000,00	0,569	275 gg	280 gg	4	6
LECCE, 05/12/2023						
<b>Tecnico</b> ING. MARCO BARBARA						

**COMUNE DI SURBO**

**PROVINCIA DI SURBO**

## **Tabella Date e Importi**

**OGGETTO:** LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA  
PLUVIALE CON ELIMINAZIONE DI POZZI ASSORBENTI  
NELL'ABITATO DI GIORGILORIO II° LOTTO FUNZIONALE (AREA  
SUD)  
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE  
6.4.D CUP: I29B18000080001 - CIG: 99183880B5

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SURBO

Il Tecnico  
(ING. MARCO BARBARA)

---

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	833,33	833,33	0,095
2 gg	833,33	1'666,67	0,190
6 gg	833,33	2'500,00	0,284
7 gg	833,33	3'333,33	0,379
8 gg	833,33	4'166,67	0,474
9 gg	833,33	5'000,00	0,569
10 gg	3'682,34	8'682,34	0,988
13 gg	3'682,34	12'364,67	1,406
14 gg	3'682,34	16'047,01	1,825
15 gg	3'682,34	19'729,35	2,244
16 gg	3'682,34	23'411,69	2,663
17 gg	3'682,34	27'094,03	3,082
22 gg	3'682,34	30'776,37	3,501
23 gg	3'682,34	34'458,70	3,919
24 gg	3'682,34	38'141,04	4,338
28 gg	3'682,34	41'823,38	4,757
29 gg	3'682,34	45'505,72	5,176
30 gg	3'682,34	49'188,06	5,595
31 gg	3'682,34	52'870,40	6,014
34 gg	3'682,34	56'552,74	6,432
35 gg	3'682,34	60'235,07	6,851
36 gg	3'682,34	63'917,41	7,270
37 gg	3'682,34	67'599,75	7,689
38 gg	3'682,34	71'282,09	8,108
41 gg	3'682,34	74'964,43	8,527
42 gg	3'682,34	78'646,77	8,945
43 gg	3'682,34	82'329,11	9,364
44 gg	3'682,34	86'011,44	9,783
45 gg	3'682,34	89'693,78	10,202
48 gg	3'682,34	93'376,12	10,621
49 gg	3'682,34	97'058,46	11,040
50 gg	3'682,34	100'740,80	11,459
51 gg	3'682,34	104'423,14	11,877
52 gg	3'682,34	108'105,48	12,296
55 gg	3'682,34	111'787,81	12,715
56 gg	3'682,34	115'470,15	13,134
57 gg	3'682,34	119'152,49	13,553
58 gg	3'682,34	122'834,83	13,972
59 gg	3'682,34	126'517,17	14,390
62 gg	3'682,34	130'199,51	14,809
63 gg	3'682,34	133'881,84	15,228
64 gg	3'682,34	137'564,18	15,647
65 gg	3'682,34	141'246,52	16,066
66 gg	3'682,34	144'928,86	16,485
69 gg	3'682,34	148'611,20	16,903
70 gg	3'682,34	152'293,54	17,322
71 gg	3'682,34	155'975,88	17,741
72 gg	3'682,34	159'658,21	18,160
73 gg	3'682,34	163'340,55	18,579
76 gg	3'682,34	167'022,89	18,998
77 gg	3'682,34	170'705,23	19,416
78 gg	3'682,34	174'387,57	19,835
79 gg	3'682,34	178'069,91	20,254
80 gg	3'682,34	181'752,25	20,673
83 gg	3'682,34	185'434,58	21,092
84 gg	3'682,34	189'116,92	21,511
85 gg	3'682,34	192'799,26	21,930
86 gg	3'682,34	196'481,60	22,348
87 gg	3'682,34	200'163,94	22,767
90 gg	3'682,34	203'846,28	23,186
91 gg	2'954,16	206'800,44	23,522
92 gg	2'954,16	209'754,60	23,858
93 gg	2'954,16	212'708,77	24,194
94 gg	2'954,16	215'662,93	24,530
97 gg	2'954,16	218'617,09	24,866
98 gg	2'954,16	221'571,25	25,202

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
99 gg	2'954,16	224'525,42	25,538
100 gg	2'954,16	227'479,58	25,874
101 gg	2'954,16	230'433,74	26,210
104 gg	2'954,16	233'387,91	26,546
105 gg	2'954,16	236'342,07	26,882
106 gg	2'954,16	239'296,23	27,218
107 gg	2'954,16	242'250,39	27,554
108 gg	2'954,16	245'204,56	27,890
111 gg	2'954,16	248'158,72	28,226
112 gg	2'954,16	251'112,88	28,562
113 gg	2'954,16	254'067,04	28,898
114 gg	2'954,16	257'021,21	29,234
115 gg	2'954,16	259'975,37	29,570
119 gg	2'954,16	262'929,53	29,906
120 gg	2'954,16	265'883,70	30,242
121 gg	2'954,16	268'837,86	30,578
122 gg	2'954,16	271'792,02	30,914
125 gg	2'954,16	274'746,18	31,250
126 gg	2'954,16	277'700,35	31,586
127 gg	2'954,16	280'654,51	31,922
128 gg	2'954,16	283'608,67	32,258
129 gg	2'954,16	286'562,84	32,594
132 gg	2'954,16	289'517,00	32,930
133 gg	2'954,16	292'471,16	33,266
134 gg	2'954,16	295'425,32	33,602
135 gg	2'954,16	298'379,48	33,938
136 gg	3'462,34	301'841,82	34,332
139 gg	3'462,34	305'304,16	34,726
140 gg	3'462,34	308'766,50	35,120
141 gg	6'493,04	315'259,54	35,858
143 gg	6'493,04	321'752,57	36,597
146 gg	6'493,04	328'245,61	37,336
147 gg	6'493,04	334'738,65	38,074
149 gg	6'493,04	341'231,68	38,813
150 gg	6'493,04	347'724,72	39,551
153 gg	6'493,04	354'217,76	40,290
154 gg	6'493,04	360'710,79	41,028
155 gg	6'493,04	367'203,83	41,767
156 gg	6'493,04	373'696,87	42,505
157 gg	6'493,04	380'189,90	43,244
160 gg	6'493,04	386'682,94	43,982
161 gg	6'493,04	393'175,98	44,721
162 gg	6'493,04	399'669,01	45,459
163 gg	6'493,04	406'162,05	46,198
164 gg	6'493,04	412'655,09	46,936
167 gg	6'493,04	419'148,12	47,675
168 gg	6'493,04	425'641,16	48,414
169 gg	6'493,04	432'134,20	49,152
170 gg	6'493,04	438'627,23	49,891
171 gg	6'493,04	445'120,27	50,629
174 gg	6'493,04	451'613,31	51,368
175 gg	6'493,04	458'106,34	52,106
176 gg	6'493,04	464'599,38	52,845
177 gg	3'755,71	468'355,09	53,272
178 gg	3'755,71	472'110,79	53,699
181 gg	3'755,71	475'866,50	54,126
182 gg	3'755,71	479'622,21	54,554
183 gg	3'755,71	483'377,92	54,981
184 gg	3'755,71	487'133,62	55,408
185 gg	3'755,71	490'889,33	55,835
188 gg	3'755,71	494'645,04	56,262
189 gg	3'755,71	498'400,75	56,689
190 gg	3'755,71	502'156,45	57,117
191 gg	3'755,71	505'912,16	57,544
192 gg	3'755,71	509'667,87	57,971
195 gg	3'755,71	513'423,58	58,398



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
196 gg	3'755,71	517'179,28	58,825
197 gg	3'755,71	520'934,99	59,253
198 gg	3'755,71	524'690,70	59,680
199 gg	3'755,71	528'446,41	60,107
202 gg	3'755,71	532'202,11	60,534
203 gg	3'755,71	535'957,82	60,961
204 gg	3'755,71	539'713,53	61,388
205 gg	3'755,71	543'469,24	61,816
206 gg	3'755,71	547'224,95	62,243
209 gg	7'466,60	554'691,55	63,092
210 gg	7'466,60	562'158,15	63,941
211 gg	7'466,60	569'624,74	64,791
212 gg	7'466,60	577'091,34	65,640
213 gg	7'466,60	584'557,94	66,489
216 gg	7'466,60	592'024,54	67,338
217 gg	7'466,60	599'491,14	68,188
218 gg	7'466,60	606'957,74	69,037
219 gg	7'466,60	614'424,34	69,886
220 gg	7'466,60	621'890,94	70,736
223 gg	7'466,60	629'357,54	71,585
224 gg	7'466,60	636'824,14	72,434
225 gg	7'466,60	644'290,74	73,283
226 gg	7'466,60	651'757,33	74,133
227 gg	7'466,60	659'223,93	74,982
230 gg	7'466,60	666'690,53	75,831
231 gg	7'466,60	674'157,13	76,680
232 gg	7'466,60	681'623,73	77,530
233 gg	7'466,60	689'090,33	78,379
234 gg	7'466,60	696'556,93	79,228
237 gg	7'466,60	704'023,53	80,078
238 gg	7'466,60	711'490,13	80,927
239 gg	7'466,60	718'956,73	81,776
240 gg	7'466,60	726'423,32	82,625
241 gg	7'466,60	733'889,92	83,475
244 gg	7'466,60	741'356,52	84,324
245 gg	7'466,60	748'823,12	85,173
246 gg	7'466,60	756'289,72	86,022
247 gg	7'466,60	763'756,32	86,872
248 gg	7'466,60	771'222,92	87,721
251 gg	7'466,60	778'689,52	88,570
252 gg	7'466,60	786'156,12	89,419
253 gg	7'466,60	793'622,72	90,269
255 gg	7'466,60	801'089,31	91,118
258 gg	7'466,60	808'555,91	91,967
259 gg	7'466,60	816'022,51	92,817
260 gg	7'466,60	823'489,11	93,666
261 gg	7'466,60	830'955,71	94,515
262 gg	7'466,60	838'422,31	95,364
265 gg	503,39	838'925,70	95,422
266 gg	503,39	839'429,09	95,479
267 gg	5'791,42	845'220,51	96,138
268 gg	5'791,42	851'011,93	96,796
269 gg	5'791,42	856'803,35	97,455
272 gg	5'791,42	862'594,77	98,114
273 gg	5'791,42	868'386,19	98,773
274 gg	5'791,42	874'177,61	99,431
275 gg	1'250,00	875'427,61	99,573
276 gg	1'250,00	876'677,61	99,716
279 gg	1'250,00	877'927,61	99,858
280 gg	1'250,00	879'177,61	100,000
<p style="text-align: center;"><b>Tecnico</b> ING. MARCO BARBARA</p>			
